


UMBAUMAßNAHME BAHNHOFSTRAßE LICHTENRADE

BAUABSCHNITT 2

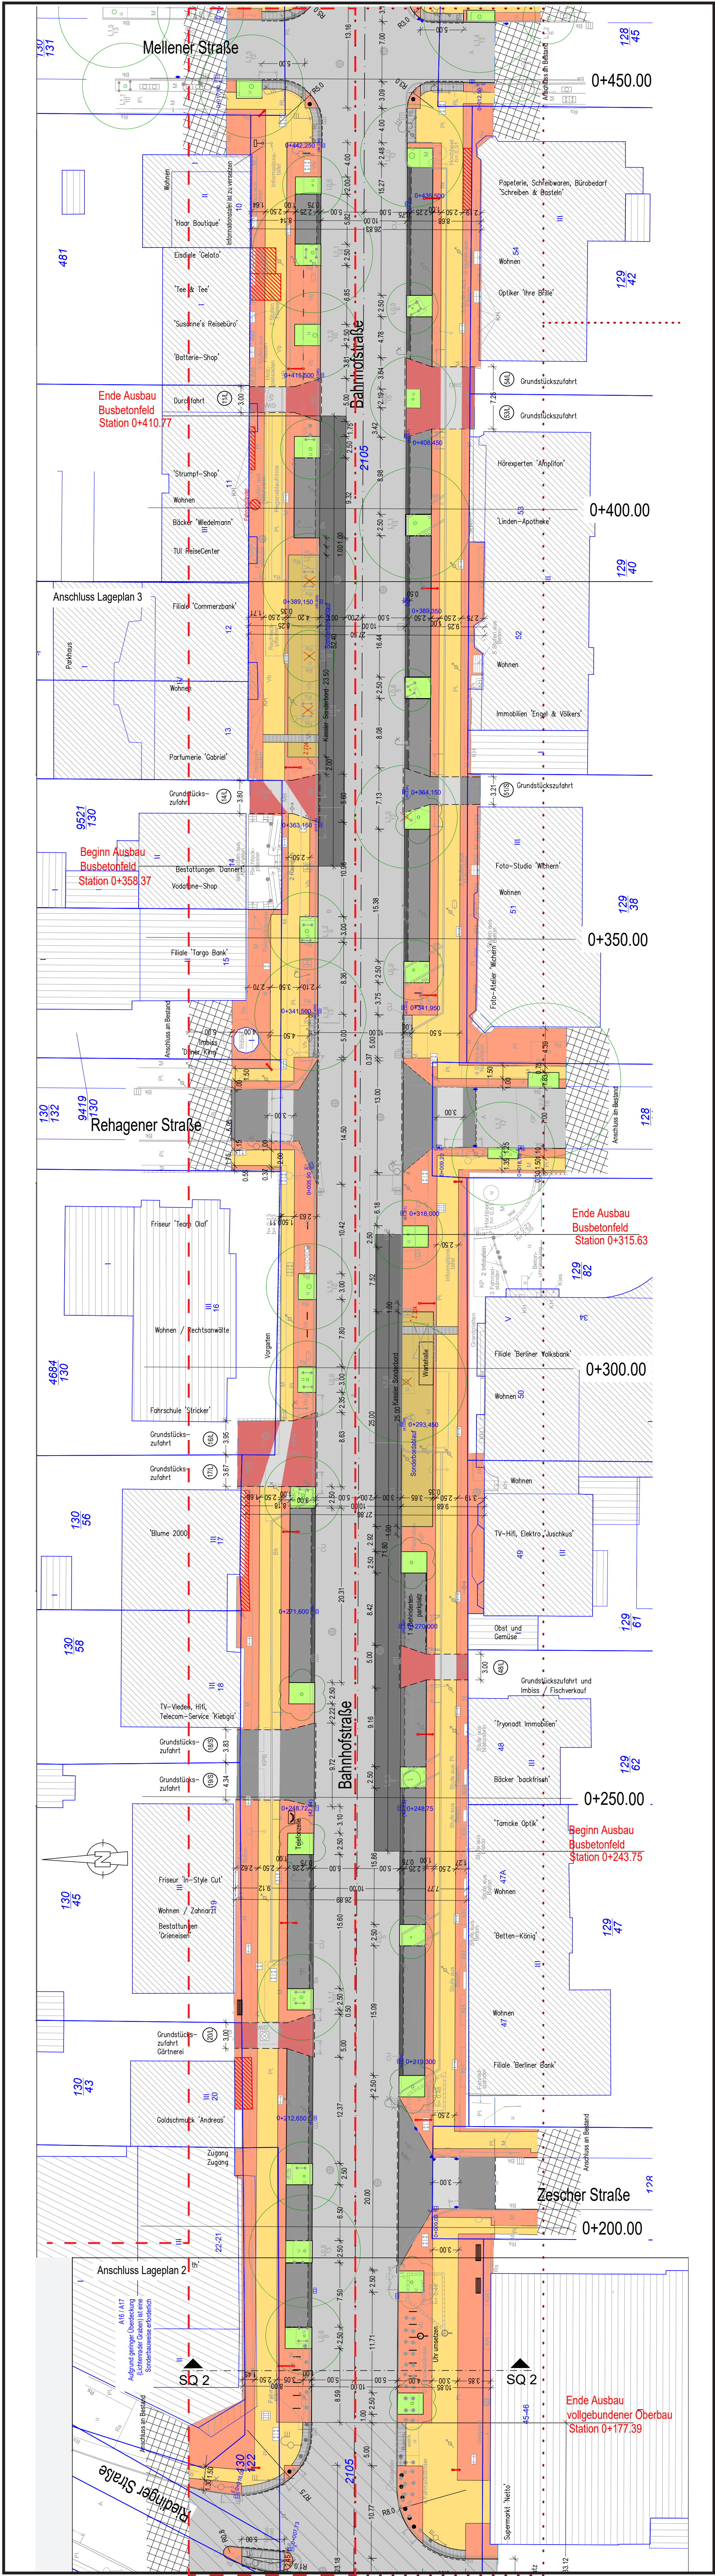

ABLAUFPLAN

Stand 13.10.2026

Leitungsnetzbetreiber

Leitungsbau BWB (274 Tage)

Hinweis: Die Tage sind jeweils Arbeitstage (Mo.-Fr.)

Leitungsbau BWB (208 Tage)

Leitungsbau BWB (224 Tage)

Leitungsbau BWB (180 Tage)

Vodafone (10 Tage)
NBB (10 Tage)
Telekom (15 Tage)
Stromnetz (10 Tage)

Vodafone (10 Tage)
Telekom (15 Tage)
Stromnetz (20 Tage)

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

- Verkehrssicherung (3 Tage)
- Abbruch Fahrbahn inkl. Erdbau & Beprobung (6 Tage)

Verkehrssicherung (2 Tage)

- Bau Provisorium vor Netto (5 Tage)
- Neubau Fahrbahn - Borde, RCT, Abläufe, Asphalt (25 Tage)
- Abbruch und Herstellung Gehweg (45 Tage)
- Bushaltestelle inkl. Abbindezeit (30 Tage)
- Rückbau und Neubau Beleuchtung (5 Tage)
- Einbau Asphaltdeckschicht und Fugen (3 Tage)
- Verkehrssicherung (1 Tag)
- Abbruch Fahrbahn inkl. Erdbau & Erprobung (3 Tage)
- Abbruch Fahrbahn inkl. Erdbau & Erprobung (2 Tage)
- Neubau Fahrbahn - Borde, RCT, Abläufe, Asphalt (19 Tage)
- Abbruch und Herstellung Gehweg (55 Tage)
- Rückbau/ Neubau Beleuchtung (5 Tage)
- Neubau LSA (30 Tage)
- Ausstattung (10 Tage)
- Einbau Asphaltdeckschicht + Fugen (3 Tage)

- Verkehrssicherung (1 Tag)
- Abbruch Fahrbahn inkl. Erdbau & Beprobung (5 Tage)
- Neubau Fahrbahn - Borde, RCT, Abläufe, Asphalt (30 Tage)

- Abbruch Gehwege inkl. Erdbau & Beprobung (10 Tage)
- Rückbau/ Neubau Beleuchtung (10 Tage)
- Neubau LSA (30 Tage)
- Ausstattung (10 Tage)
- Einbau Asphaltdeckschicht + Fugen (2 Tage)
- Markierung (3 Tage)

- Neubau Fahrbahn - Borde, RCT, Abläufe, Asphalt (25 Tage)
- Bushaltestelle inkl. Abbindezeit (30 Tage)
- Abbruch Gehwege (8 Tage)
- Rückbau Beleuchtung (10 Tage)
- Neubau Beleuchtung (10 Tage)
- Neubau LSA (10 Tage)
- Neubau Gehweg (55 Tage)
- Ausstattung (6 Tage)
- Einbau Asphaltdeckschicht + Fugen (2 Tage)
- Markierung (5 Tage)
